



Elementplan Hentschke-Träger Feld 3 FT3.1

Lage: Demonstratorbauwerk, Feld 3
Herstellung: Einbaulage, stehend
Gewicht: 10,92 t Beton + 0,71 t Stahlrohr + 0,71 t Bewehrung und Vorspannung

- Schalung -
Blick in Schalung


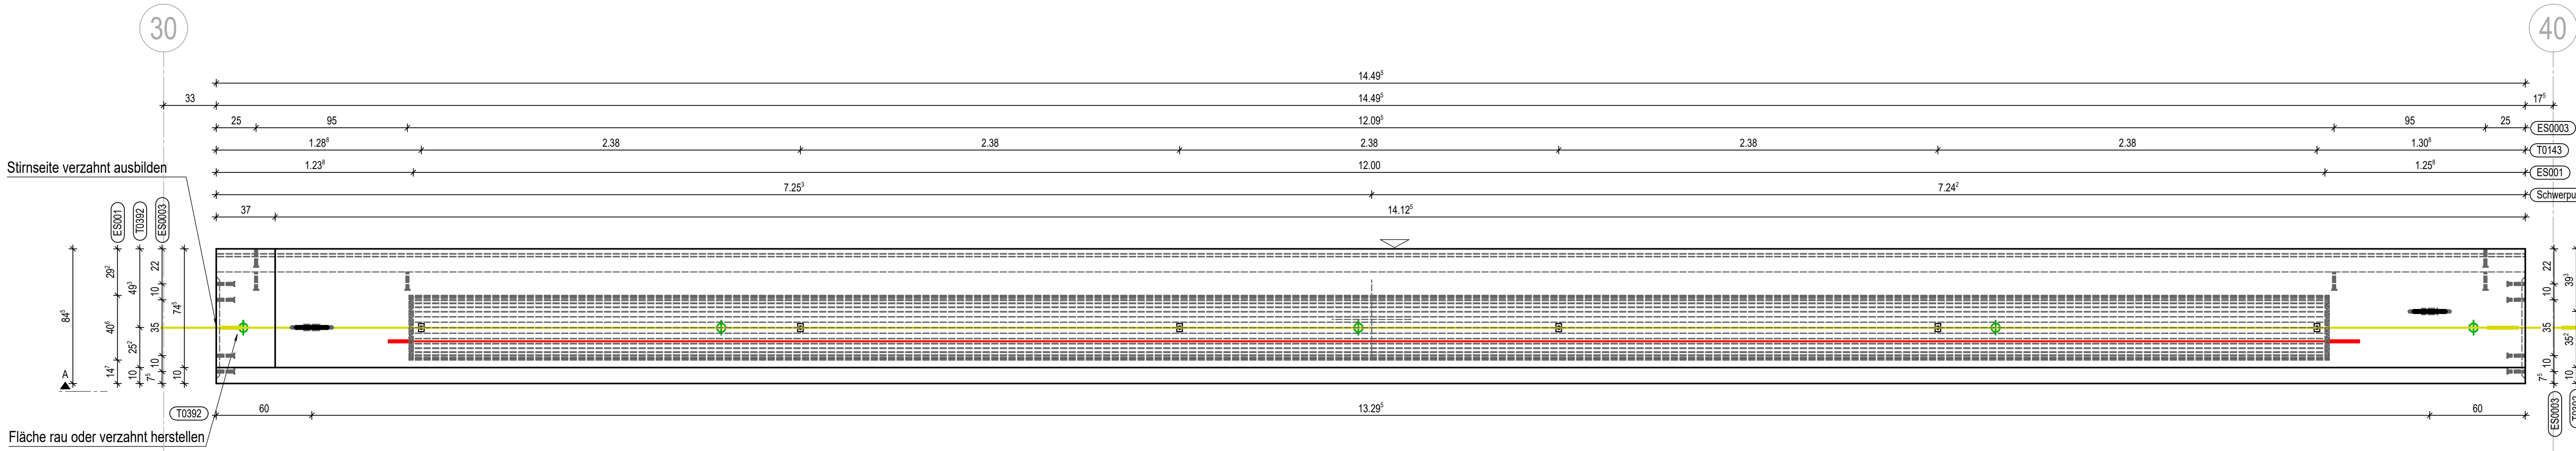


Schnitt A - A

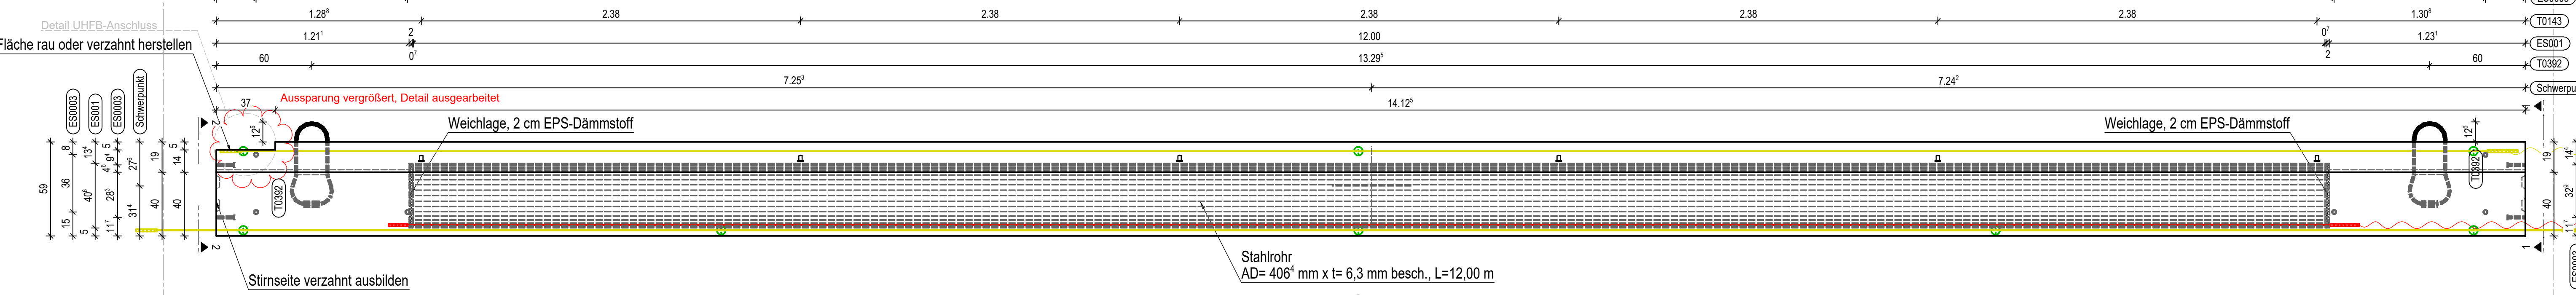

- Bewehrung -


Blick in Schalung

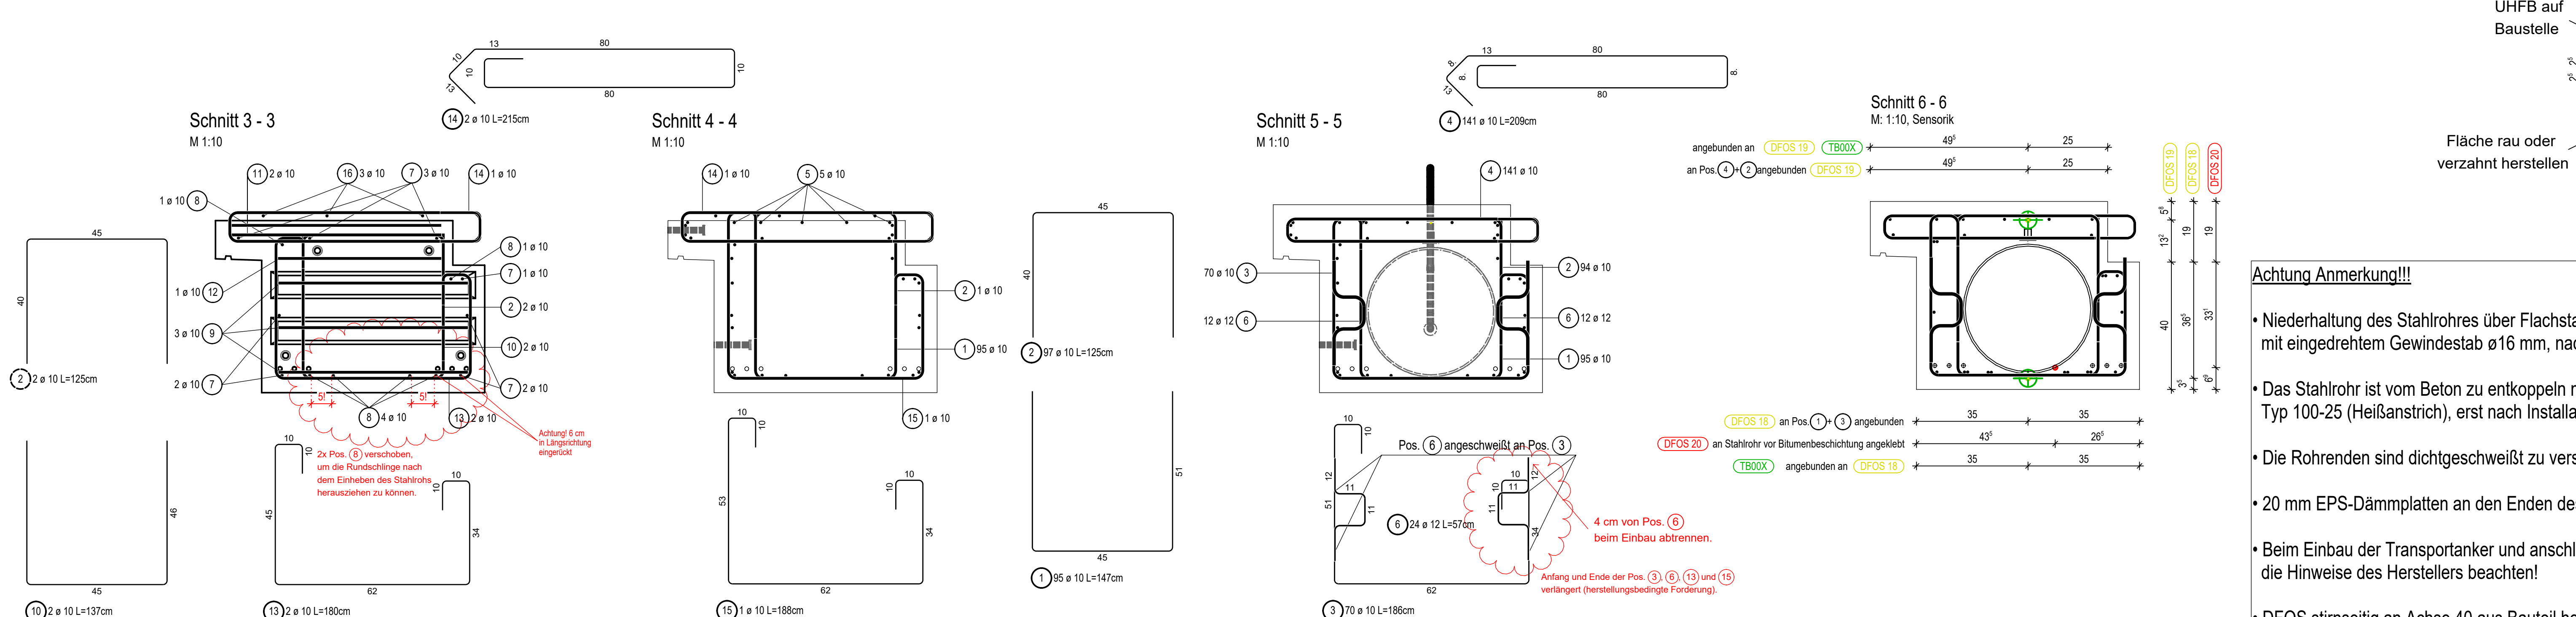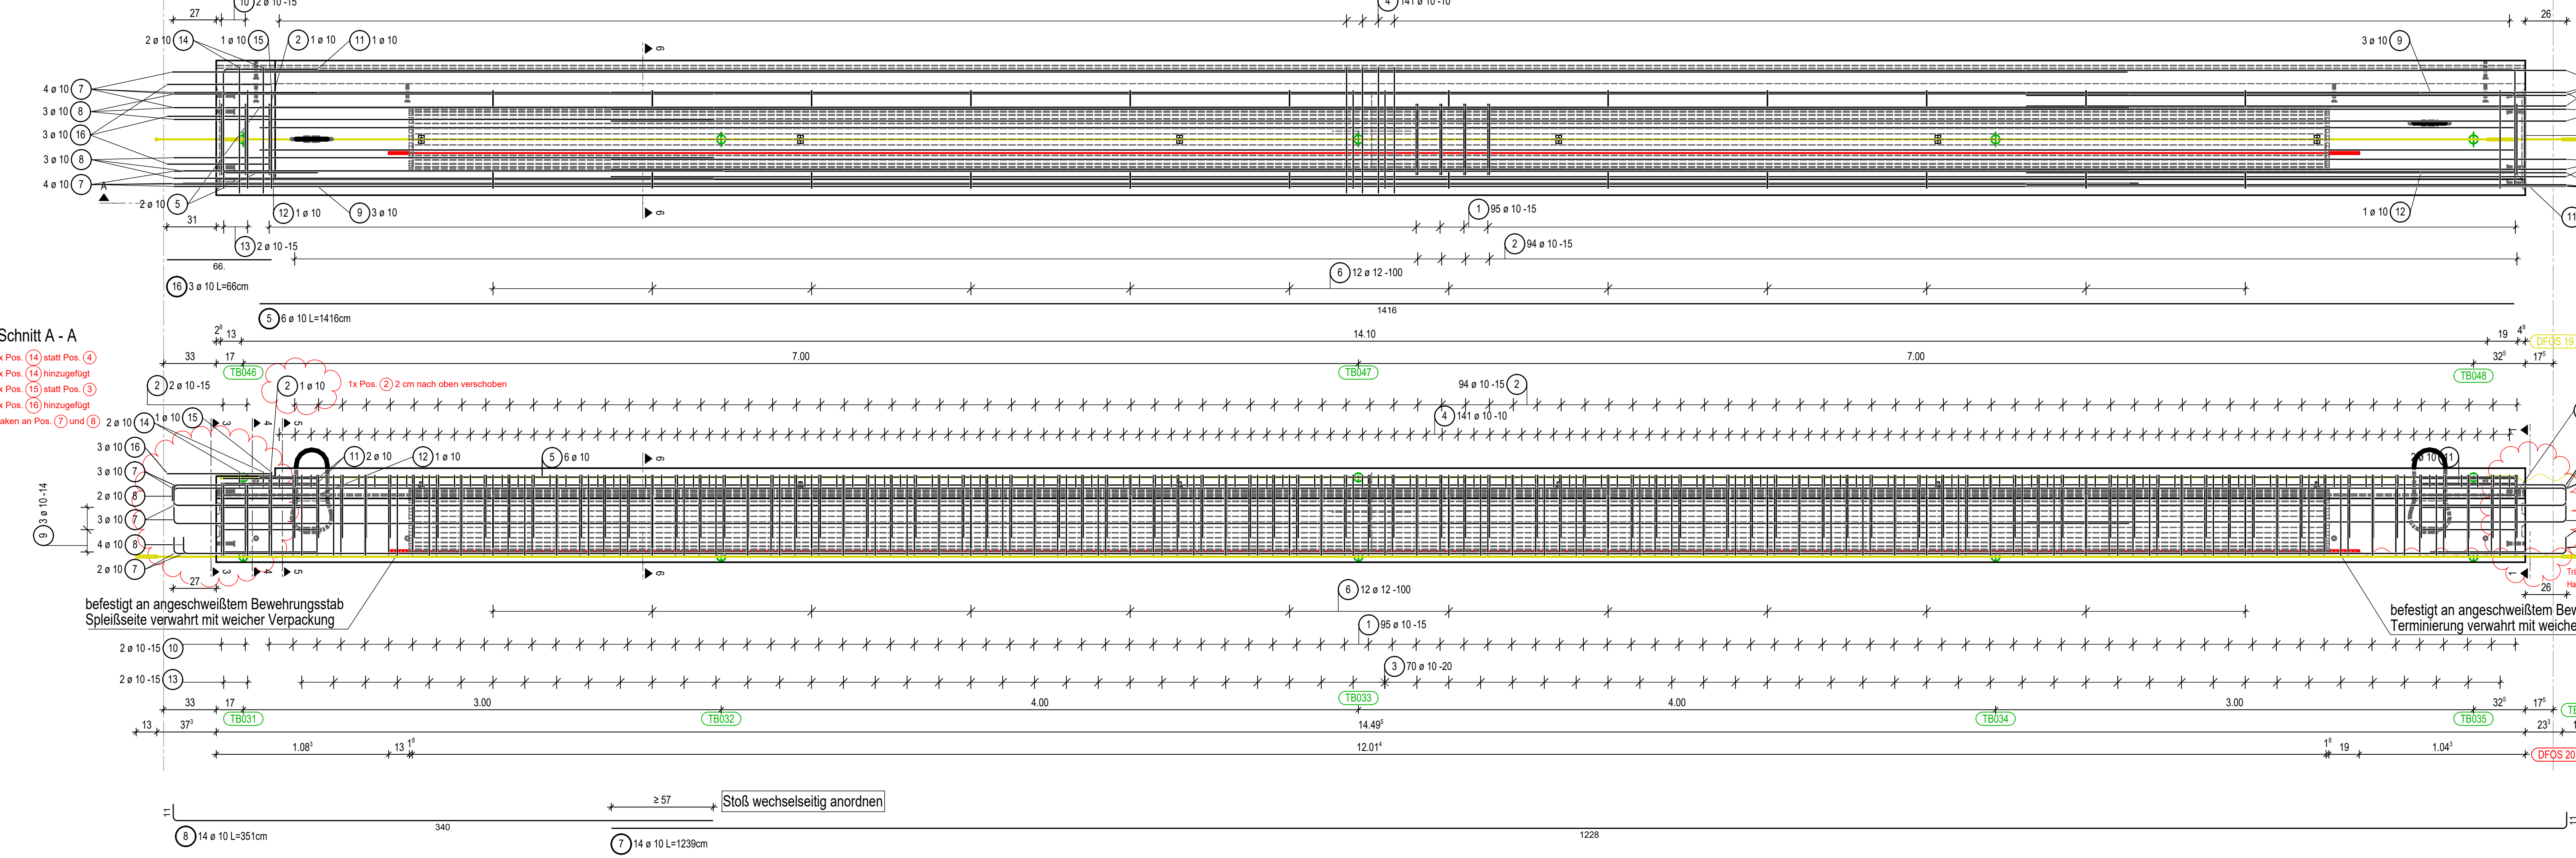




Angaben zur Vorspannung (sofortiger Verbund)

Zulassung:	Nr. Z-12-3-84
Typ:	0,5-2x1,2mm 93 mm ² (12,5 mm)
Spannstahlgüte:	ST 1660/1660
Anzahl:	6
Vorspannkraft:	$F_{p1} = 121 \text{ kN je Litze}$
Vorspannkraft Spannbett:	121 kN x 6 = 726 kN (Spannbett)
Länge:	14,49 m (jeine Überstand)
Gewicht:	0,73 kg/m
Gewicht (gesamt):	0,73 kg/m x 14,49 m x 6 = 63,488 kg
Umspannfähigkeit $f_{m, \text{umh}}/f_t$:	21 N/mm ²

Schnitt 2 - 2

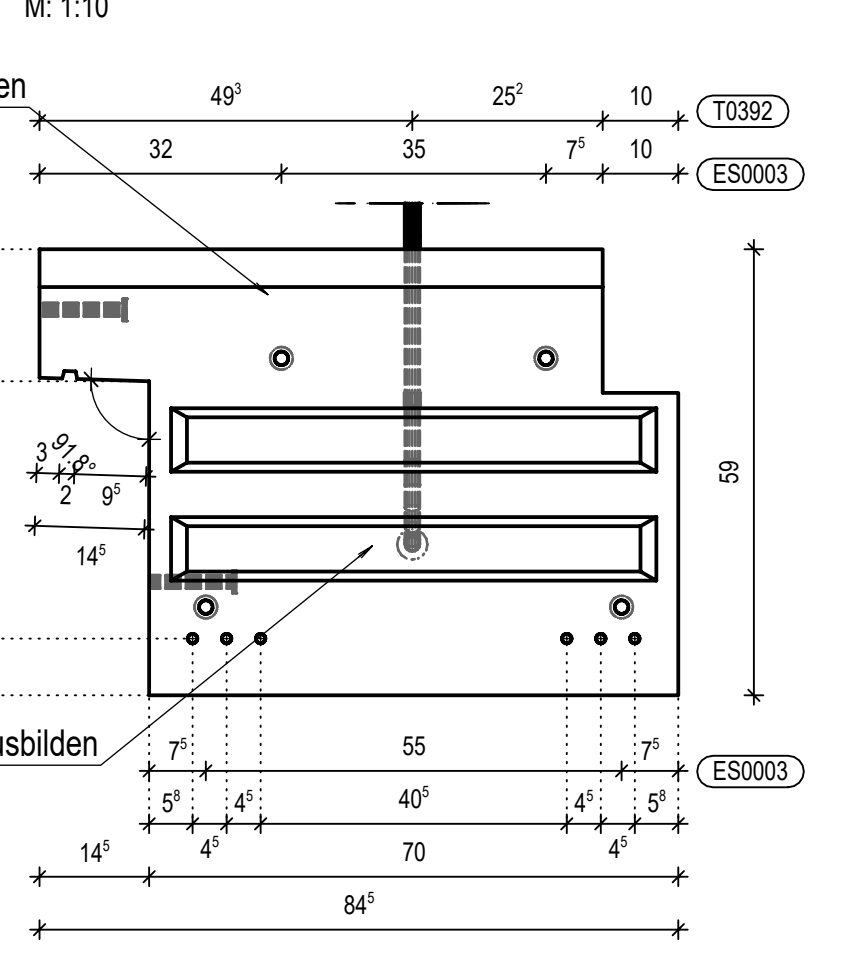

Schnitt 1 - 1

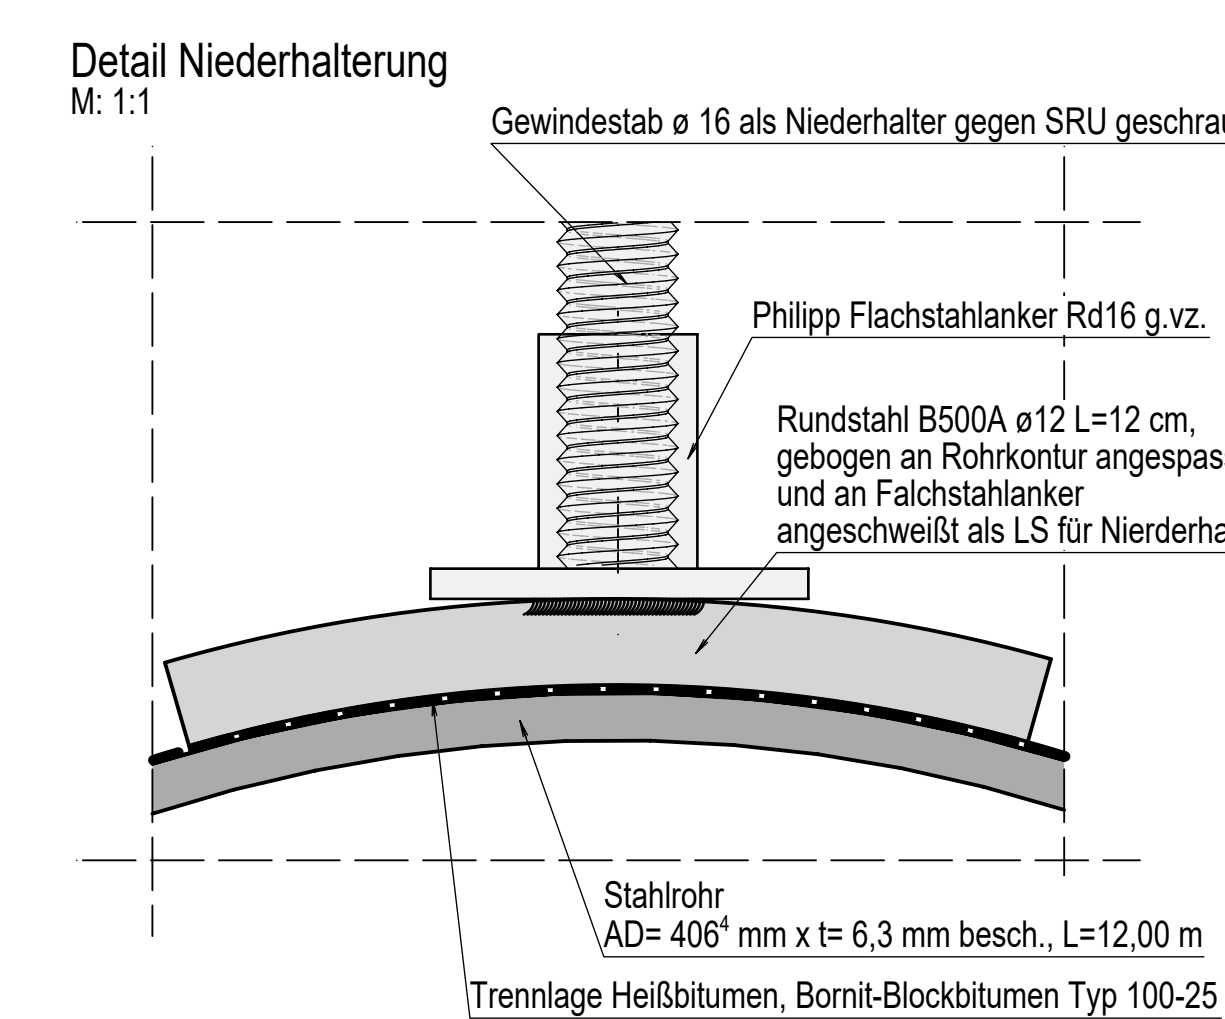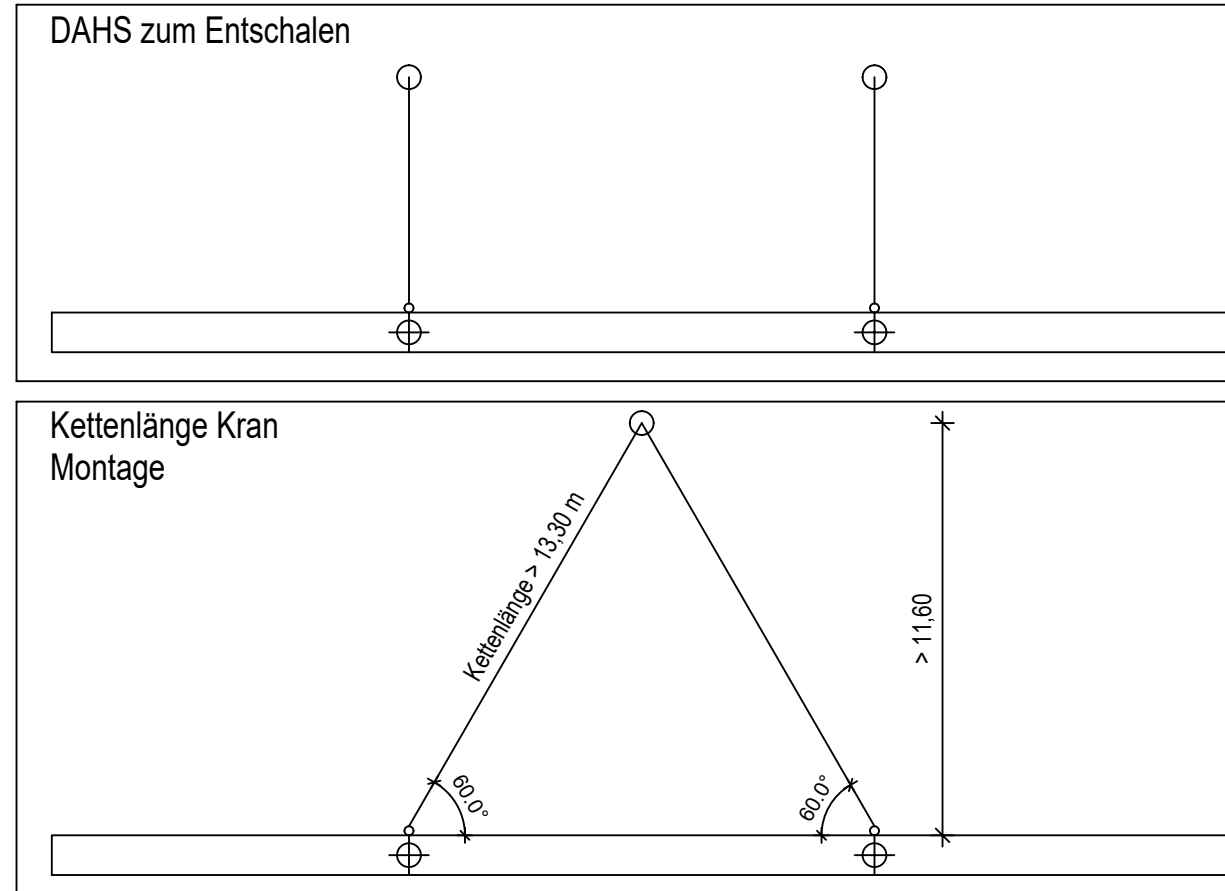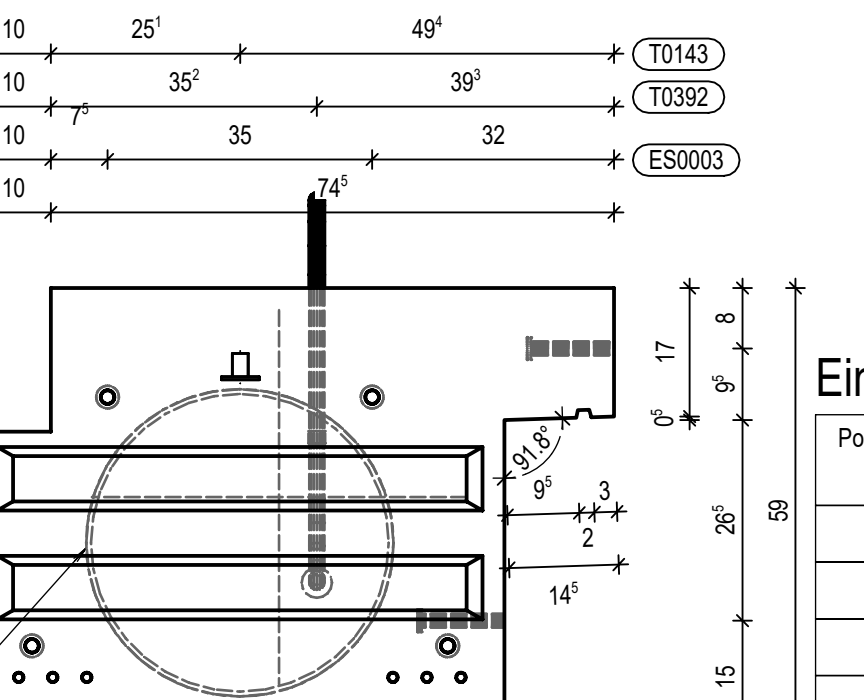

Einbauteile

Pos.	Anzahl (Stk)	Bezeichnung
ES0003	14	Abschaltkappe DW15, Profilgröße 75 mm, Spezialkunststoff, inkl. Nagelstopfen
ES0001	1	Stahlrohr (Fa. Swarcberg) AD=406,4 mm, L=12,00 m, S235, beschichtet (Bornt Blo
T0143	6	Flachstahler R016 (1,2 t)
T0392	2	Drahtseilabbeschläufe 10,0 t (verz.)

Einbauteile Sensorik

Pos.	Menge (Stk, m, m ²)	Bezeichnung
DFOS 18	1 x	EpiklonSensor 3,0 m R., BD0, C2=0,19m, A=15,10m, C1=0,13m, P1=3,50
DFOS 19	1 x	EpiklonSensor 3,0 m R., BD0, C2=0,19m, A=14,10m, C1=0,13m, P1=3,00
DFOS 20	1 x	EpiklonSensor 1,0 m R., B5Dm, C2=0,19m, A=12,05m, C1=0,13m, P1=4,80
TB00X	3 x	Thermosensor Typ K, TB046 - TB048
TB00X	5 x	Thermosensor Typ K, TB031 - TB035

Angaben zu Arbeitsfugen

Oberfläche	Erläuterung	Profilierung
Kat. C: rau	Oberfläche mit Rillen versehen. Tiefe: min. 3 mm, Rillenabstand ca. 4,0 cm z.B. mit Rechen	
Kat. D: verzahnt	Oberfläche profiliert. Tiefe 2,1 cm Zahnlänge: 8,4 cm	

BAUSTOFFANGABEN (Planspezifisch)

Besteile	Expositionsklassen	Stirn	st	min c	min c
Brückenträger	XC4	C 50/60, Sorte 701.1	15mm	25mm	40mm
Betonstahl	BS 500 (MB)	Standardklasse: 1,0/1,0 cm			

Biegen von Betonstählen

Mindestwerte der Biegedurchmesser D [mm]	Biegedurchmesser D [mm]
D min = 10 a	D min = 4 a
D min = 7 a	D min = 7 a

Werkplanung

Pos.	Stück	Einzel	Gesamt	Masse
1	95	10	139,65	86,16
2	97	10	121,25	74,81
3	70	10	130,20	80,33
4	141	10	294,69	181,82
5	6	10	14,16	9,46
6	24	12	0,57	13,68
7	14	10	12,39	173,46
8	14	10	3,51	49,14
9	6	10	1,80	10,80
10	2	10	1,97	2,74
11	4	10	1,86	7,44
12	2	10	1,71	3,42
13	2	10	1,60	3,60
14	2	10	2,15	4,30
15	1	10	1,88	1,88
16	3	10	0,66	1,98

Achtung Anmerkung!!!

- Niederhaltung des Stahlrohres über Flachstahler gem. Detail mit eingedrehtem Gewindestab ø16 mm, nach Betonage ausdrehen
- Das Stahlrohr ist vom Beton zu entkoppeln mittels Bornt-Blockbitumen Typ 100-25 (Heißenstrich), erst nach Installation des EpsilonSensors
- Die Rohrenden sind dichtgeschweißt zu verschließen
- 20 mm EPS-Dämmplatten an den Enden des Rohres anordnen
- Beim Einbau der Transportanker und anschließendem Transportieren die Hinweise des Herstellers beachten!
- DFOS stirnseitig an Achse 40 aus Bauteil herausführen

Stabliste Bst B500B

Pos.	Stück	Ø	Einzel	Gesamt	Masse
1	95	10	1,47	139,65	86,16
2	97	10	1,25	121,25	74,81
3	70	10	1,86	130,20	80,33
4	141	10	2,09	294,69	181,82
5	6	10	14,16	94,96	52,42
6	24	12	0,57	13,68	12,15
7	14	10	12,39	173,46	107,02
8	14	10	3,51	49,14	30,32
9	6	10	1,80	10,80	6,66
10	2	10	1,97	2,74	1,69
11	4	10	1,86	7,44	4,59
12	2	10	1,71	3,42	2,11
13	2	10	1,60	3,60	2,22
14	2	10	2,15	4,30	1,16
15	1	10	1,88	1,88	1,16
16	3	10	0,66	1,98	1,22
