


Elementplan Hentschke-Träger Feld 3 FT3.6




Lage: Demonstratorbauwerk, Feld 3
Herstellung: Einbaulage, stehend
Gewicht: 10,92 t Beton + 0,71 t Stahlrohr + 0,71 t Bewehrung und Vorspannung

- Schalung -
Blick in Schalung

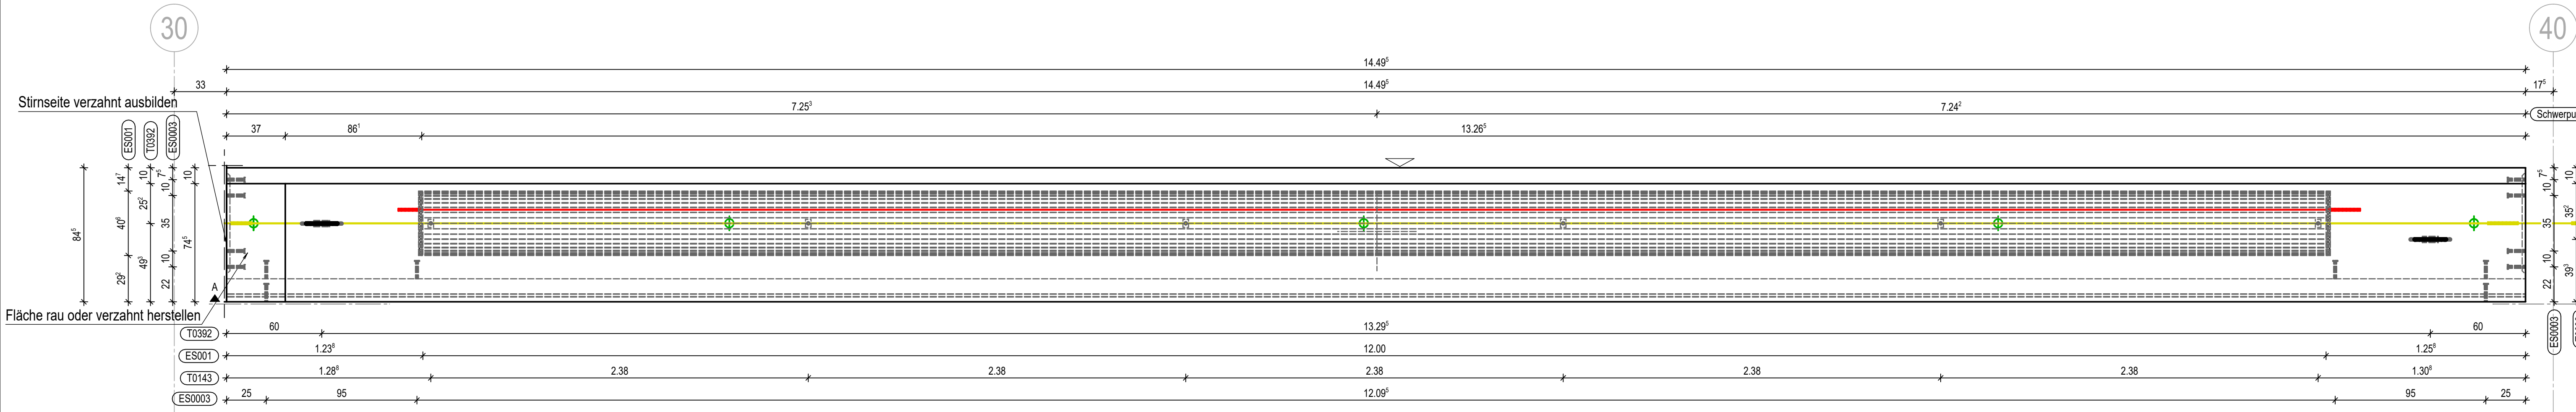


Angaben zur Vorspannung (sofortiger Verbund)

Zulassung:	Nr. Z-12-3-84
Typ:	0,5-2x-Litze 93 mm ² (12,5 mm)
Spannstahlgüte:	ST 1650/1850
Anzahl:	6
Vorspannkraft:	$P_{100} = 121 \text{ kN je Litze}$
Vorspannkraft Spannbett:	121 kN x 6 = 726 kN (Spannbett)
Länge:	14,49 m (jeine Überstand)
Gewicht:	0,73 kg/m
Gewicht (gesamt):	0,73 kg/m x 14,49 m x 6 = 63,488 kg
Umspannfähigkeit $f_{m, \text{umh}}/f_t$:	21 N/mm ²

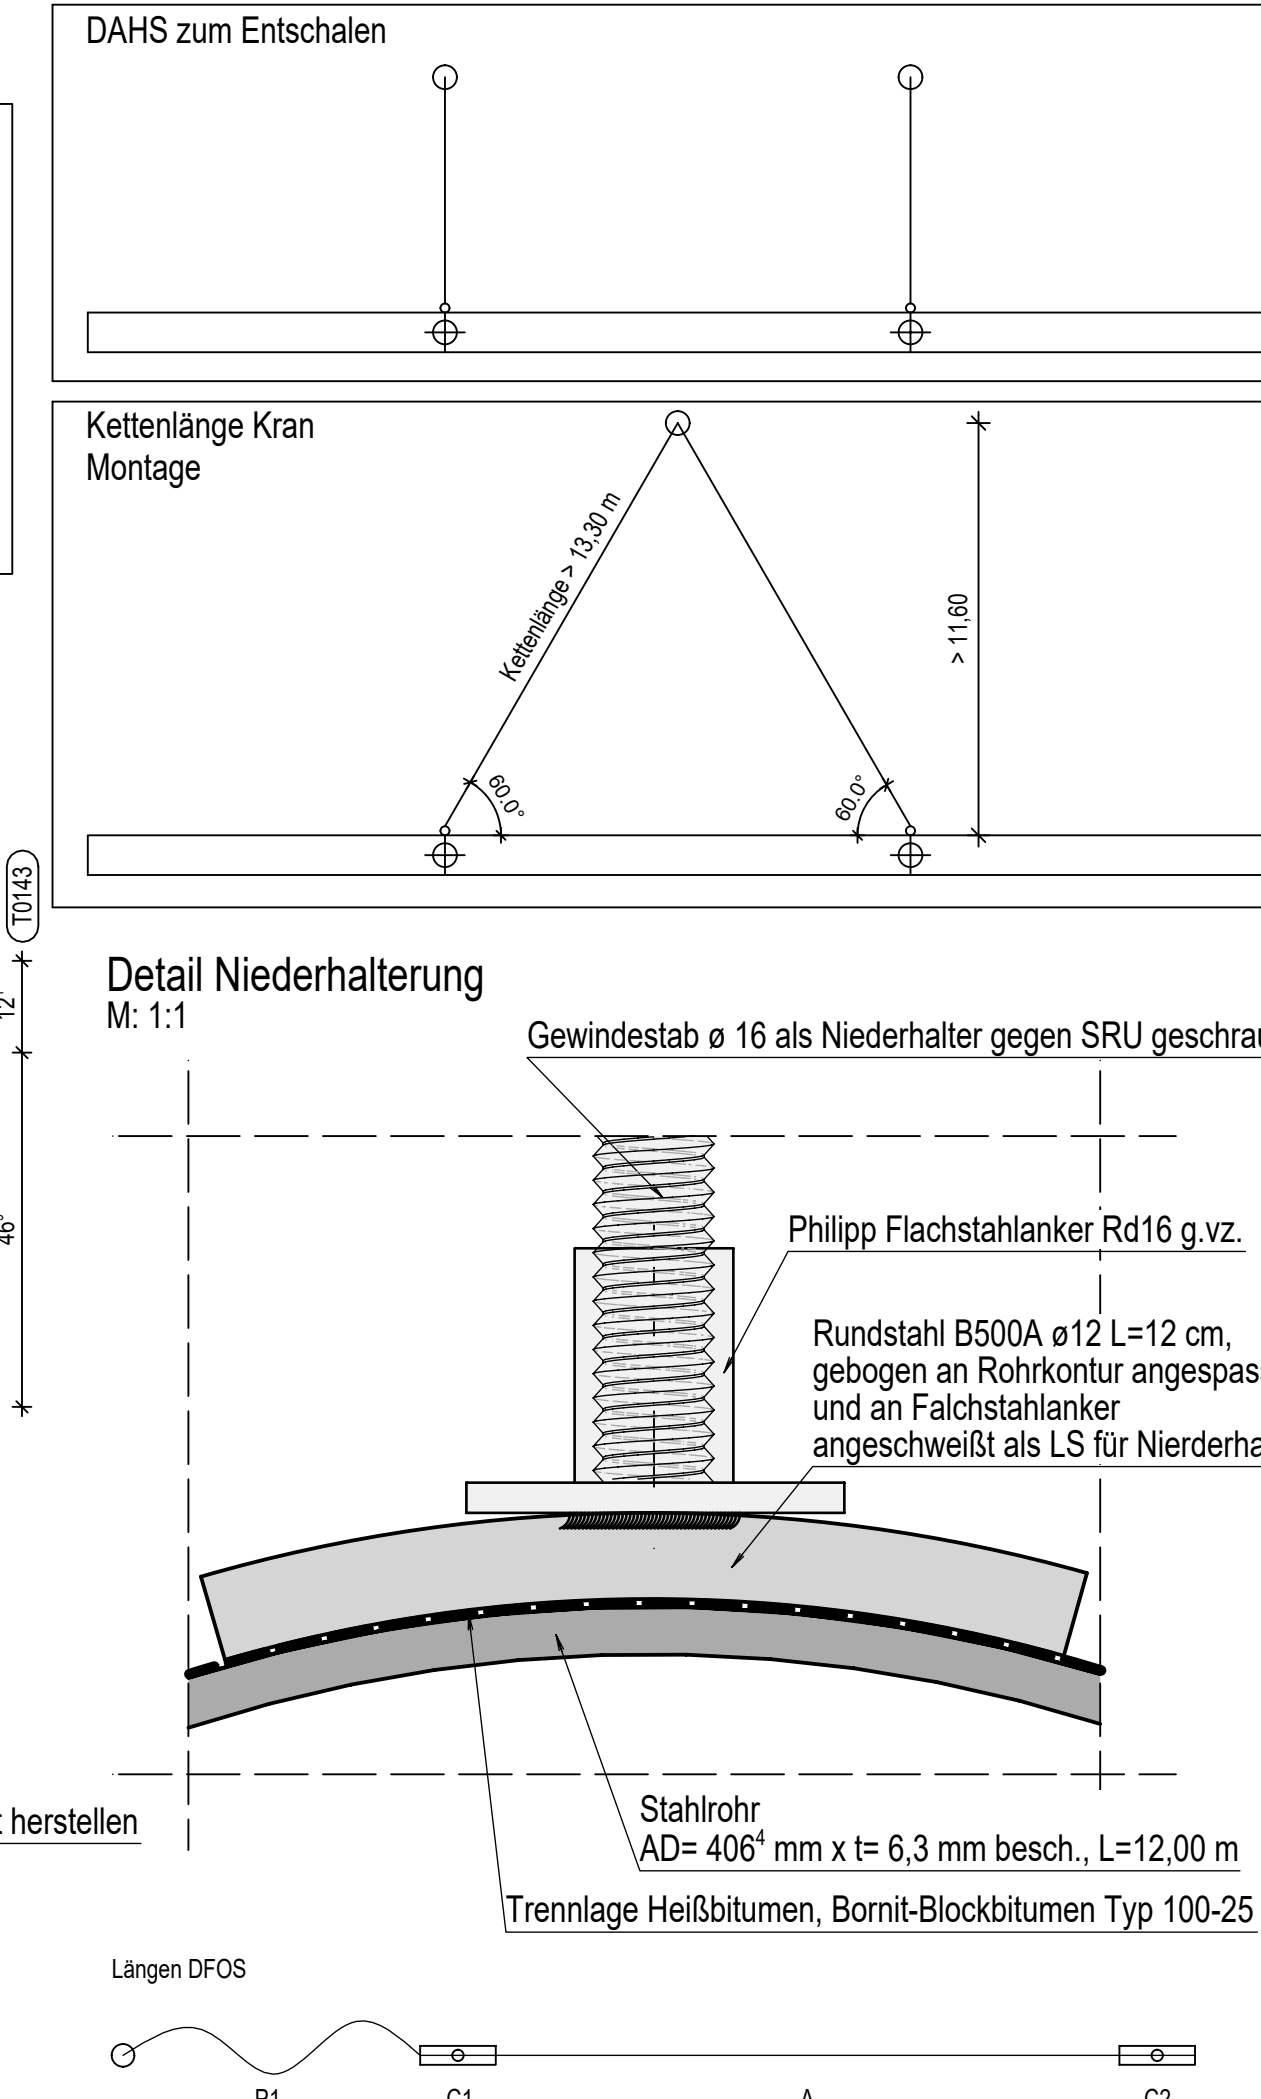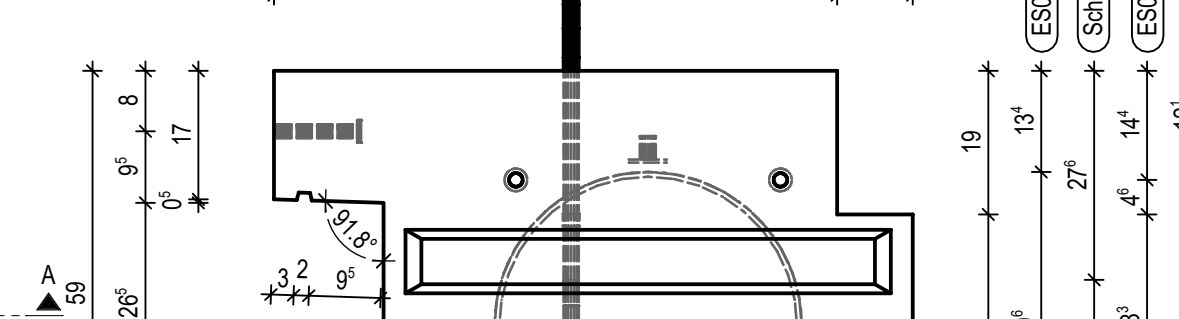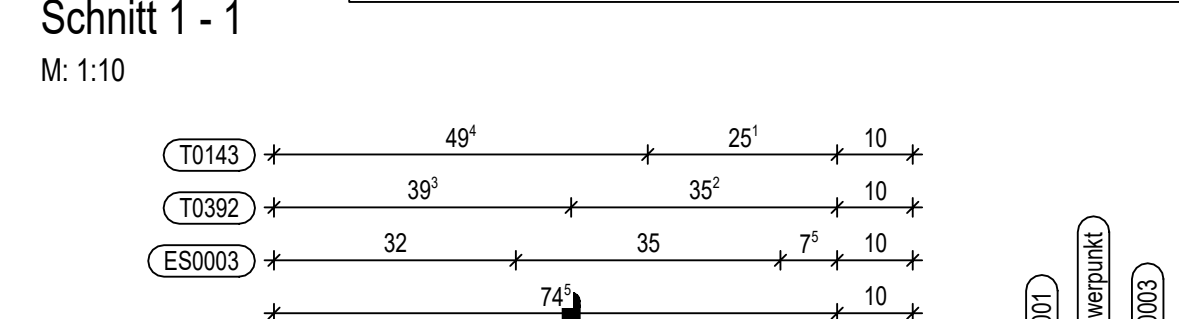


Schnitt A - A










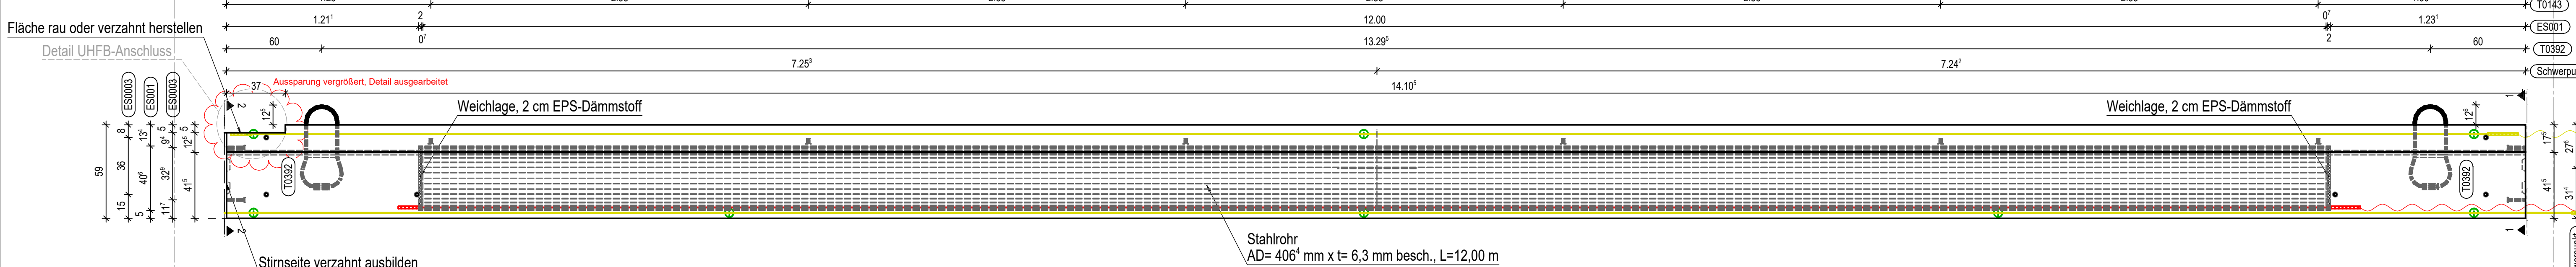


- Bewehrung -

Blick in Schalung

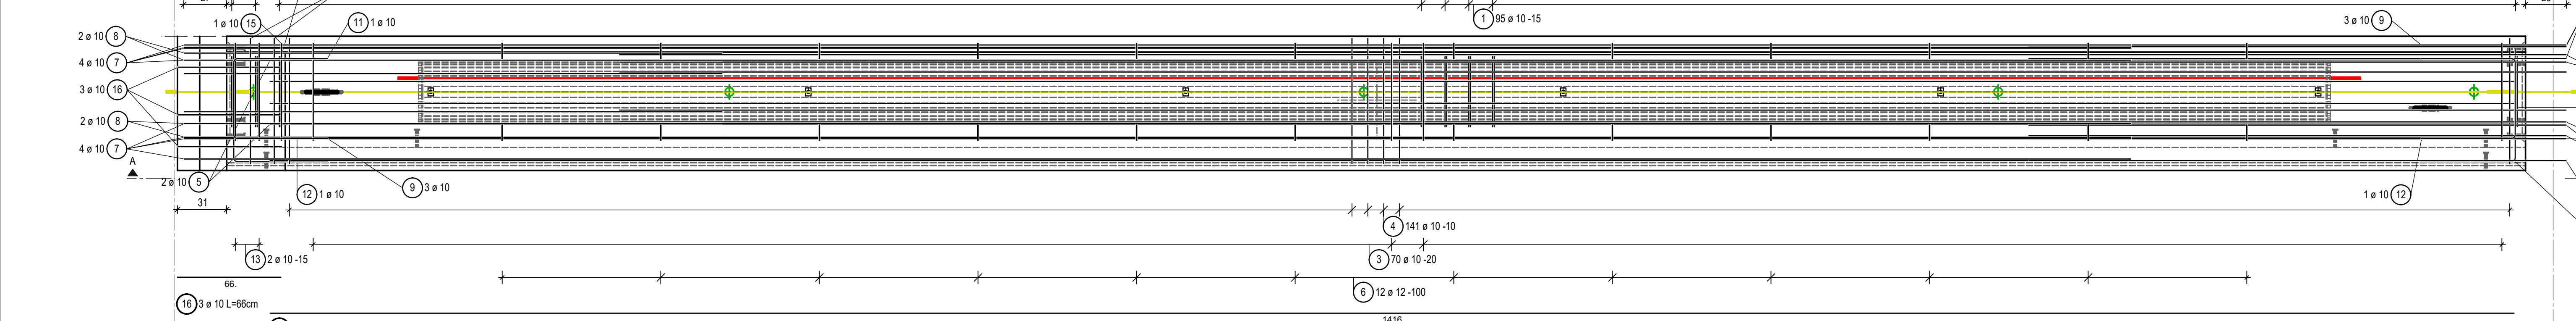

Schnitt A - A

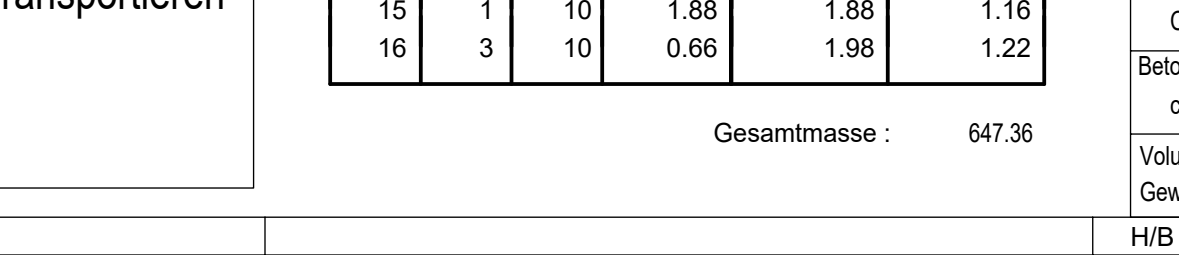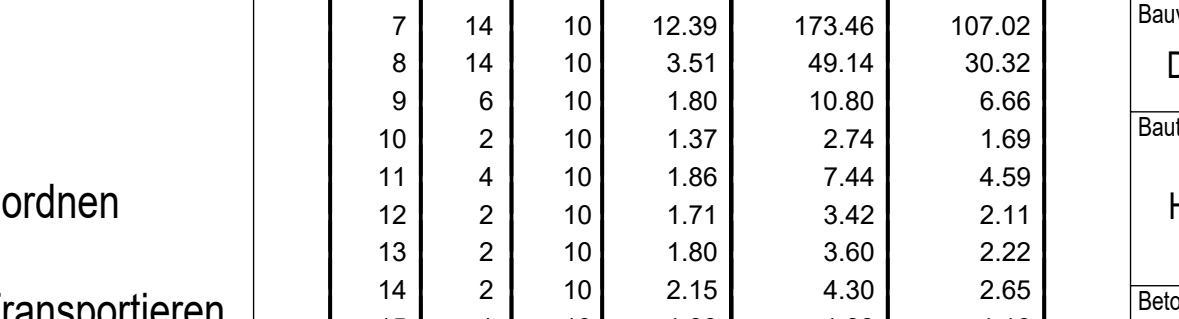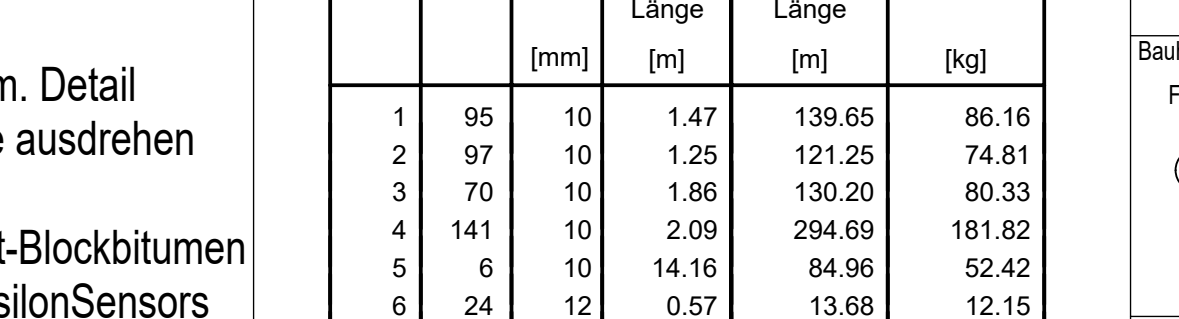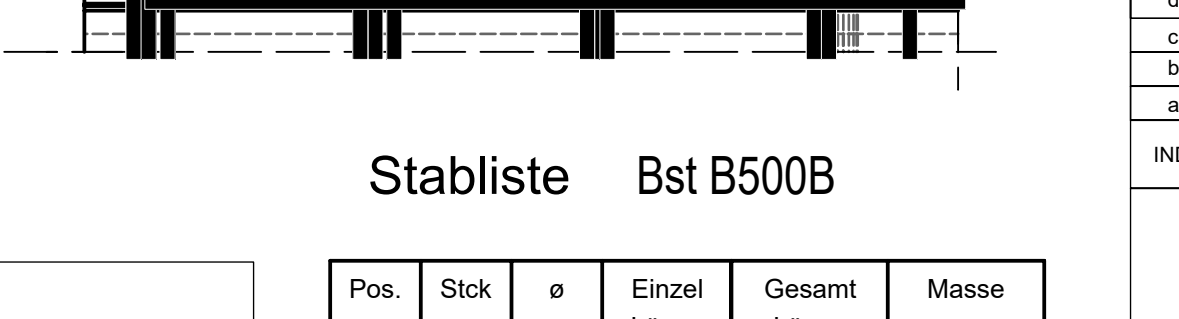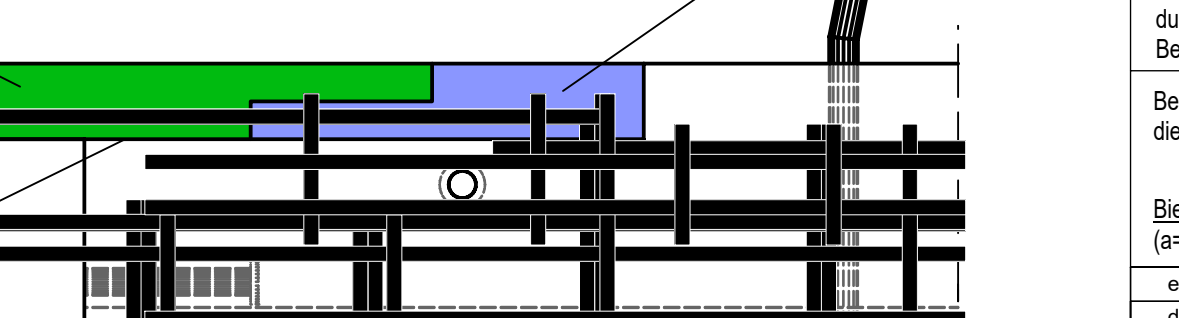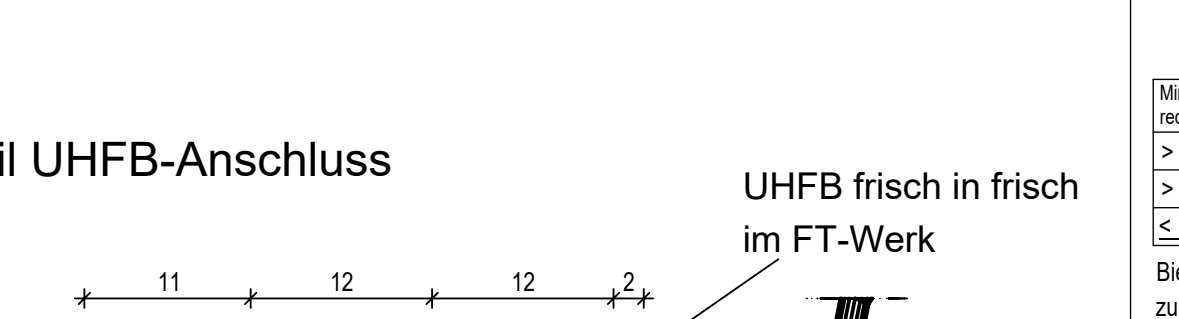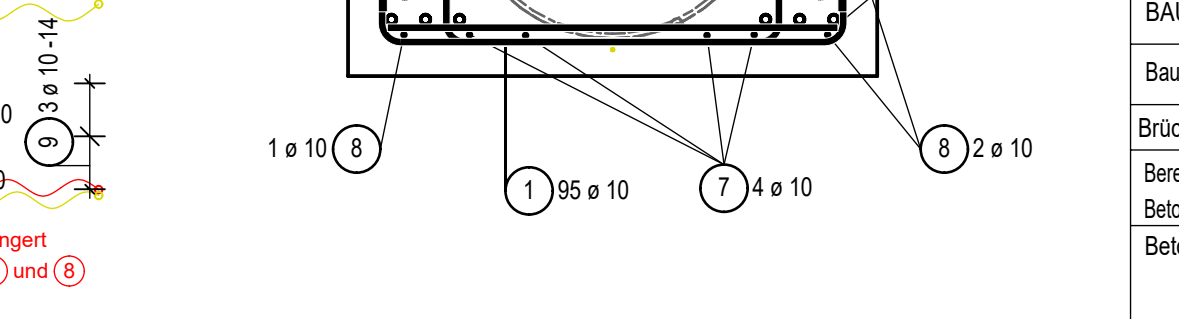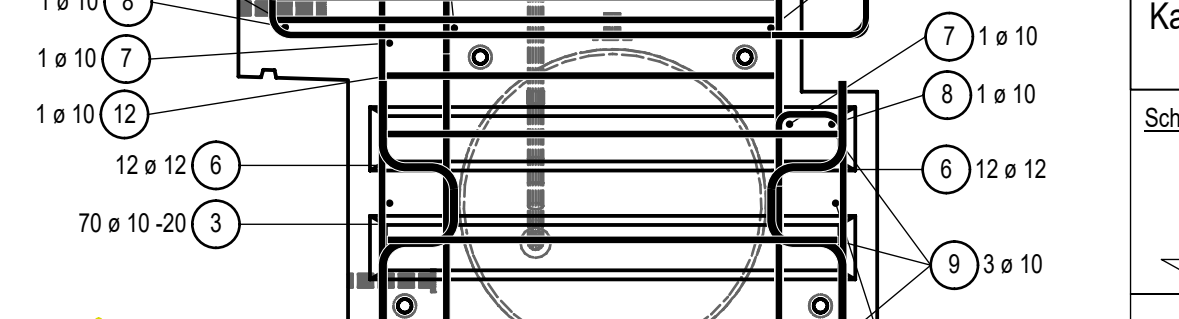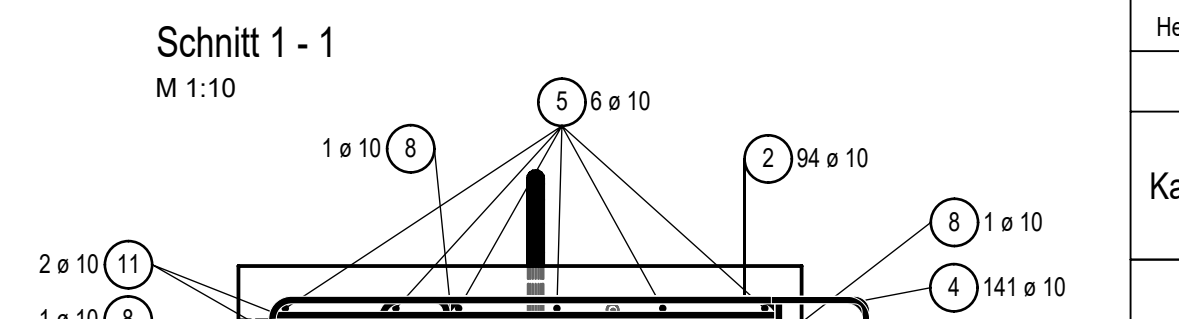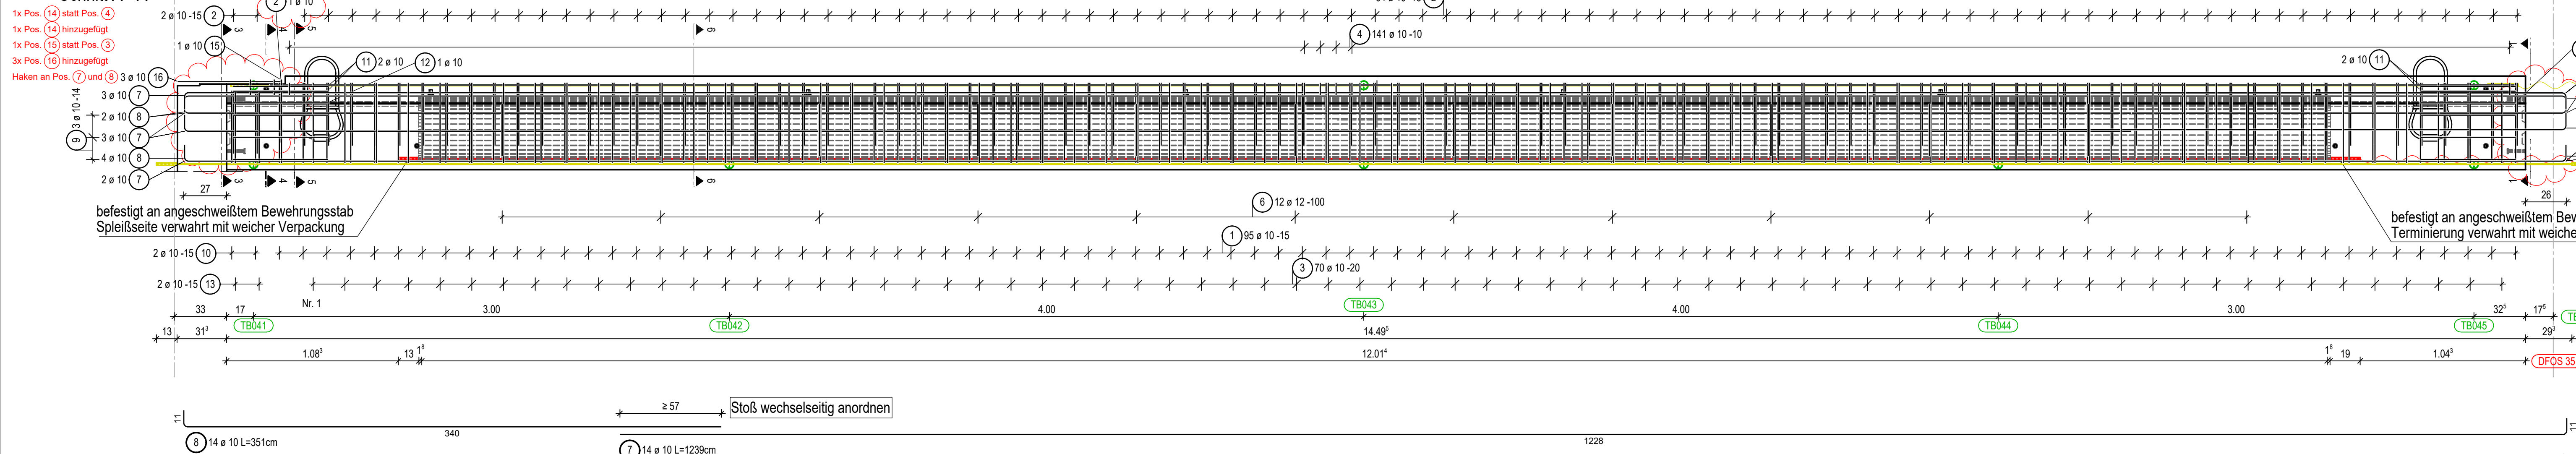

Einbauteile

Pos.	Anzahl (Stk)	Bezeichnung
ES0003	14	Abschalhilfe DW15, Profillänge 75 mm, Spezialkunststoff, inkl. Nagelstopfen
ES0001	1	Stahlrohr (Fa. Swarzenberg) AD=406,4 mm, L=12,00 m, S235, beschichtet (Bornt Blo
T0143	6	Flachstahlanker RD16 (1,2 t)
T0392	2	Drahtseilabbeschläufe 10,0 t (verz.)

Einbauteile Sensorik

Pos.	Menge (Stk, m, m ²)	Bezeichnung
DFOS 33	1 x	EpiklonSensor 3,0 m R., BDO, C2=0,19m, A=15,10m, C1=0,13m, P1=3,20
DFOS 34	1 x	EpiklonSensor 3,0 m R., BDO, C2=0,19m, A=14,10m, C1=0,13m, P1=4,00
DFOS 35	1 x	EpiklonSensor 1,0 m R., BSDm, C2=0,19m, A=12,05m, C1=0,13m, P1=3,40
TB00X	5 x	Thermosensor Typ K, TB041 - TB045
TB00X	3 x	Thermosensor Typ K, TB052 - TB054

Angaben zu Arbeitsfugen

Oberfläche	Erläuterung	Profilierung
Kat. C: rau	Oberfläche mit Rillen versehen, Tiefe: min. 3 mm, Rillenabstand ca. 4,0 cm z.B. mit Rechen	
Kat. D: verzahnt	Oberfläche profiliert, Tiefe: 2,1 cm Zahnlänge: 6,4 cm	

BAUSTOFFANGABEN (Planspezifisch)

Bauteile	Expositionsklassen	Stirn	st	min c	min c
Brückenträger	XC4			15mm	25mm
Bewehrung					40mm

Biegen von Betonstählen

Mindestwerte der Biegedurchmesser D [mm]	Biegedurchmesser D [mm]
> 100 mm und > 7 a	D min = 10 a
> 50 mm und > 3 a	D min = 15 a
< 50 mm oder < 3 a	D min = 20 a

Biegen nach A) und B)

Mindestwerte der Biegedurchmesser D [mm]	Biegedurchmesser D [mm]
> 100 mm und > 7 a	D min = 10 a
> 50 mm und > 3 a	D min = 15 a
< 50 mm oder < 3 a	D min = 20 a

Biegen nach A) und B)

Mindestwerte der Biegedurchmesser D [mm]	Biegedurchmesser D [mm]
> 100 mm und > 7 a	D min = 10 a
> 50 mm und > 3 a	D min = 15 a
< 50 mm oder < 3 a	D min = 20 a

Biegen nach A) und B)

Mindestwerte der Biegedurchmesser D [mm]	Biegedurchmesser D [mm]
> 100 mm und > 7 a	D min = 10 a
> 50 mm und > 3 a	D min = 15 a
< 50 mm oder < 3 a	D min = 20 a

Biegen nach A) und B)

Mindestwerte der Biegedurchmesser D [mm]	Biegedurchmesser D [mm]
> 100 mm und > 7 a	D min = 10 a
> 50 mm und > 3 a	D min = 15 a
< 50 mm oder < 3 a	D min = 20 a

Biegen nach A) und B)

Mindestwerte der Biegedurchmesser D [mm]	Biegedurchmesser D [mm]
> 100 mm und > 7 a	D min = 10 a
> 50 mm und > 3 a	D min = 15 a
< 50 mm oder < 3 a	D min = 20 a

Biegen nach A) und B)

Mindestwerte der Biegedurchmesser D [mm]	Biegedurchmesser D [mm]
> 100 mm und > 7 a	D min = 10 a
> 50 mm und > 3 a	D min = 15 a
< 50 mm oder < 3 a	D min = 20 a

Biegen nach A) und B)

Mindestwerte der Biegedurchmesser D [mm]	Biegedurchmesser D [mm]
> 100 mm und > 7 a	D min = 10 a
> 50 mm und > 3 a	D min = 15 a
< 50 mm oder < 3 a	D min = 20 a

Biegen nach A) und B)

Mindestwerte der Biegedurchmesser D [mm]	Biegedurchmesser D [mm]
> 100 mm und > 7 a	D min = 10 a
> 50 mm und > 3 a	D min = 15 a
< 50 mm oder < 3 a	D min = 20 a

Achtung Anmerkung!!!

- Niederhaltung des Stahlrohres über Flachstahlanker gem. Detail mit eingedrehtem Gewindestab $\phi 16 \text{ mm}$, nach Betonage ausdrehen
- Das Stahlrohr ist vom Beton zu entkoppeln mittels Bornt-Blockbitumen Typ 100-25 (Heißenstrich), erst nach Installation des EpsilonSensors
- Die Rohrenden sind dichtgeschweißt zu verschließen
- 20 mm EPS-Dämmplatten an den Enden des Rohres anordnen
- Beim Einbau der Transportanker und anschließendem Transportieren die Hinweise des Herstellers beachten!
- DFOS stirnseitig an Achse 40 aus Bauteil herausführen

Stabliste Bst B500B

Pos.	Stück	a [mm]	Einzel Länge [m]	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	95	10	1,47	139,65	86,16
2	97	10	1,25	121,25	74,81
3	70	10	1,86	130,20	80,33
4	141	10	2,09	294,69	181,82
5	6	10	14,16	84,96	52,42
6	24	12	0,57	13,68	12,15
7	14	10	12,39	173,46	107,02
8	14	10	3,51	49,14	30,32
9	6	10	1,80	10,80	6,66
10	2	10	1,37	2,74	1,69
11	4	10	1,86	7,44	4,59
12	2	10	1,71	3,42	2,11
13	2	10	1,80	3,60	2,22
14	2	10	2,15	4,30	2,65
15	1	10	1,88	1,88	1,16
16	3	10	0,66	1,98	1,22

Werkplanung

Pos.	Stück	a [mm]	Einzel Länge [m]	Gesamt Länge [m]	Masse [kg]
1	95	10	1,47	139,65	86,16
2	97	10	1,25	121,25	74,81
3	70	10	1,86	130,20	80,33
4	141	10	2,09	294,69	181,82
5	6	10	14,16	84,96	52,42
6	24	12	0,57	13,68	12,15
7	14	10	12,39	173,46	107,02
8	14	10	3,51	49,14	30,32
9	6	10	1,80	10,80	6,66
10	2	10	1,37	2,74	1,69
11	4	10	1,86	7,44	4,59
12	2	10	1,71	3,42	2,11
13	2	10	1,80	3,60	2,22
14	2	10	2,15	4,30	2,65
15	1	10	1,88	1,88	1,16
16	3	10	0,66	1,98	1,22
